

## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

### CONFORM

**Datum keuring:** 24/02/2024      **Inspecteur:** Nigel Rodriguez Molina      **Mentor:** -      **Installateur:** MP Electro  
**ID-label:** Hoogbos 24 (lot7), 9255 Buggenhout      **Klantreferentie:** -  
B.T.W. nr.:BE 0738 961 836      **Serienummer:** 19481293

Merk en type meettoestel: metrel Eurotest ET61557

**Datum verslag:** 25/02/2024

#### Plaats van het onderzoek

**Straatnaam:** Hoogbos  
**Huisnummer:** 24  
**Busnummer:** -  
**Postcode:** 9255  
**Gemeente:** Buggenhout  
**Land:** België

#### Eigenaar

**Naam:** Daelemans - Okens  
**Straatnaam:** Hoogbos  
**Huisnummer:** 24  
**Busnummer:** -  
**Postcode:** 9255  
**Gemeente:** Buggenhout  
**Land:** België

#### Installateur

**Naam:** MP Electro  
**BTW nr.:** BE 0738 961 836  
**Telefoonnummer:** 0499991677  
**E-mail:** mpelectro2200@gmail.com

**Type :** woning

**EAN :** 54

**Teller Nr. :** Nog te plaatsen

Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



#### Aard onderzoek:

**Is de installatie aangevat voor 01/06/2023?**

Ja

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

**Netbeheerder:** FLUVIUS

**Spanning:** 3N400V

**Meter / bord verbinding:** 10 mm²

**Max beveiliging:** 40 A

**Aantal borden:** 1

**Aantal kringen:** 25

**Aardelektrode:** Aardingslus

Ri algemeen: 27,9 MΩ

RE: 2,41 Ω

OK

OK



## DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I <sub>t</sub>	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	25	OK	OK
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	7	OK	OK

## BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm <sup>2</sup> )
3	C	16		2	1,5
3	C	16		2	2,5
18	C	20		2	2,5
1	C	25		4	4

Visueel nazicht (algemeen) OK

Directe aanraking OK

Indirecte aanraking OK

Aansluitingen OK

schema in bijlage door Aceg vzw NA

Equipotentiale verbindingen OK

Doorsnede geleiders OK

Continuïteit OK

Verlichting / toestellen OK

## OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 17 De hoofdequipotentiaalverbindingen zijn nog aan te sluiten na plaatsing van de nutsleidingen.

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 22 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoestellen en/of -meubels nog te voorzien.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

nota/note 5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

nota/note 9 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.

## BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 24/2/2049

De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

De installatie is aangevat voor 01/06/2023, hierdoor is rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in 6.5.8. van Boek I.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 4

## VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Nigel Rodriguez Molina

**Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.**

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.  
 Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.  
 Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

**Kwaliteit**

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.  
 De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


**Stappenplan voor een installatie die conform is:**

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 24/2/2049	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



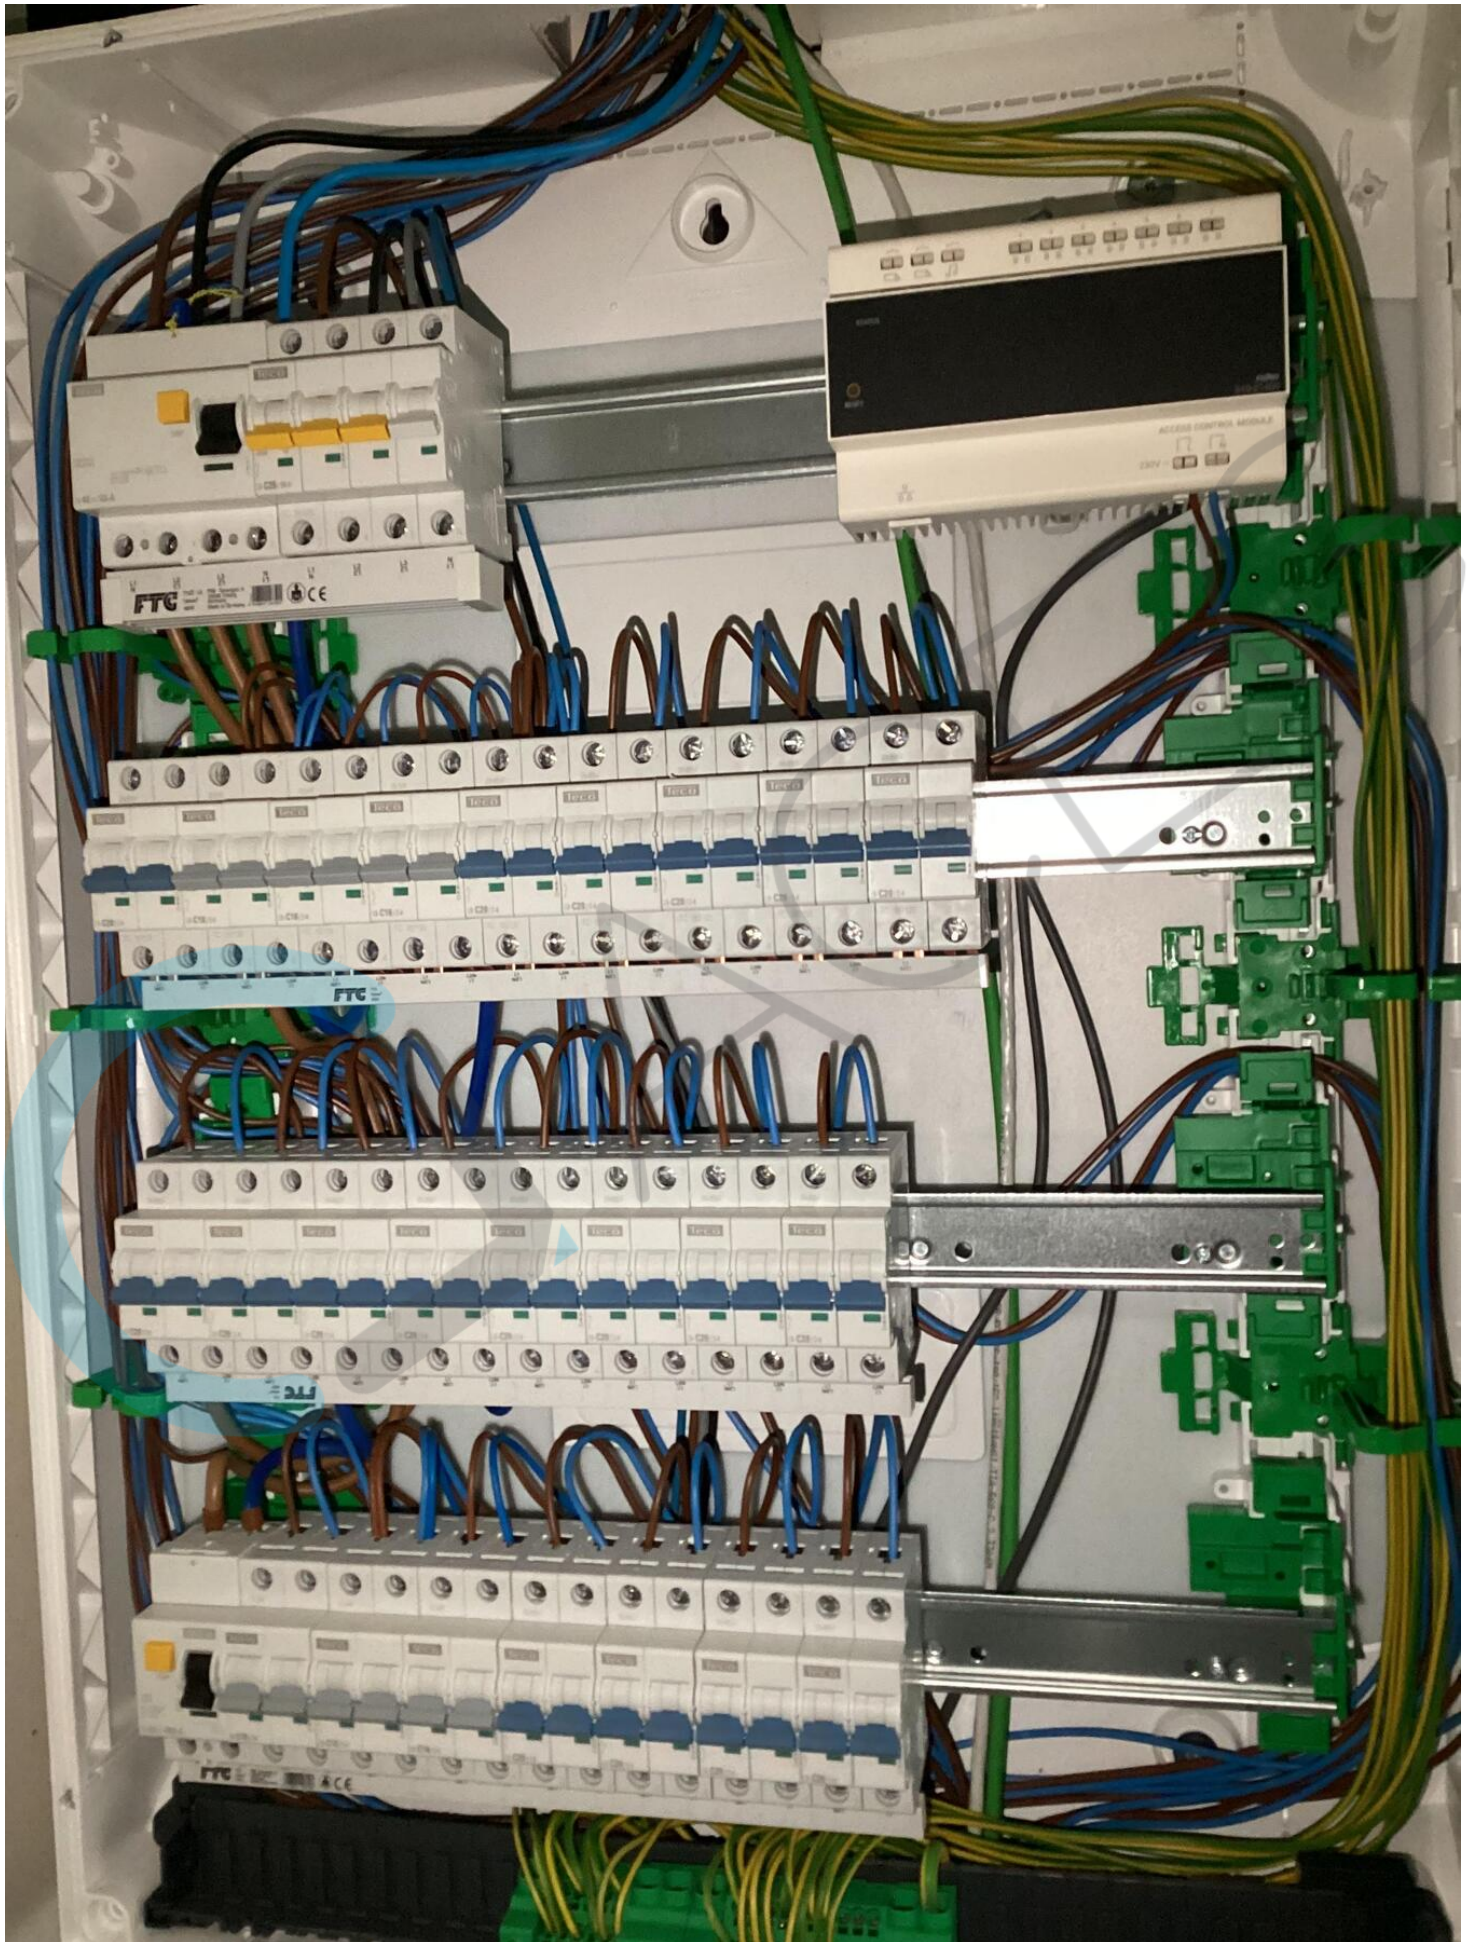

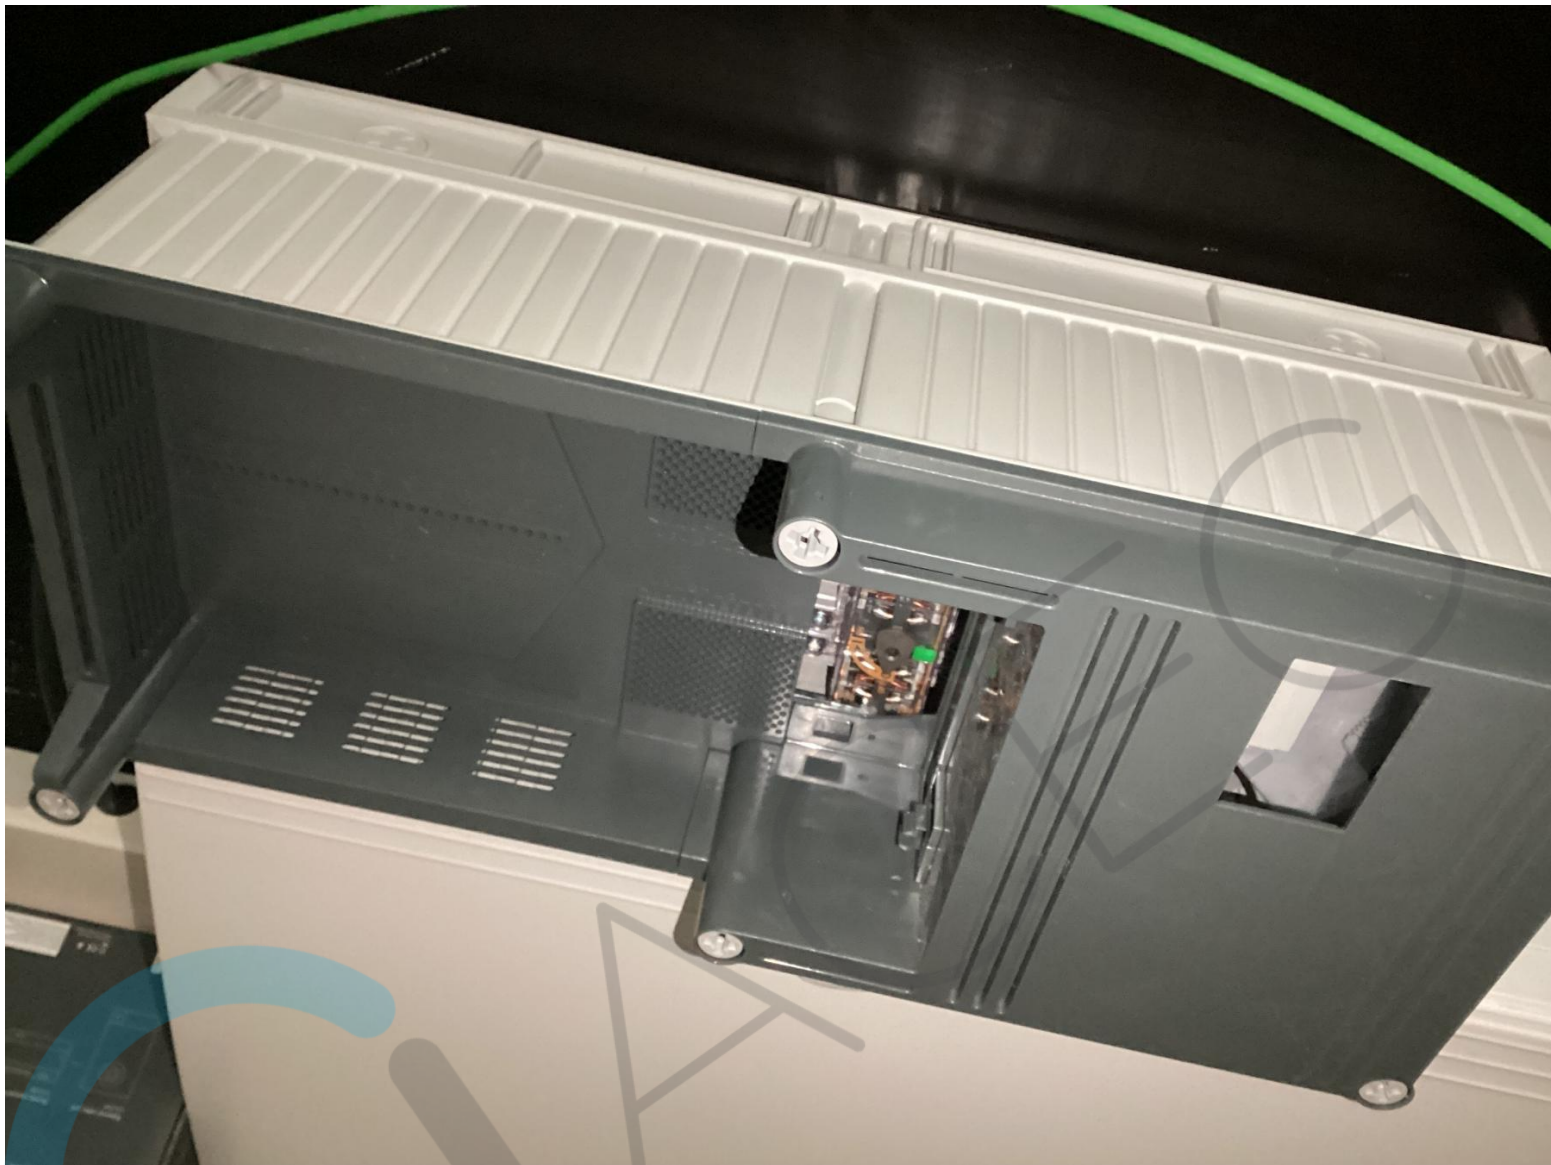


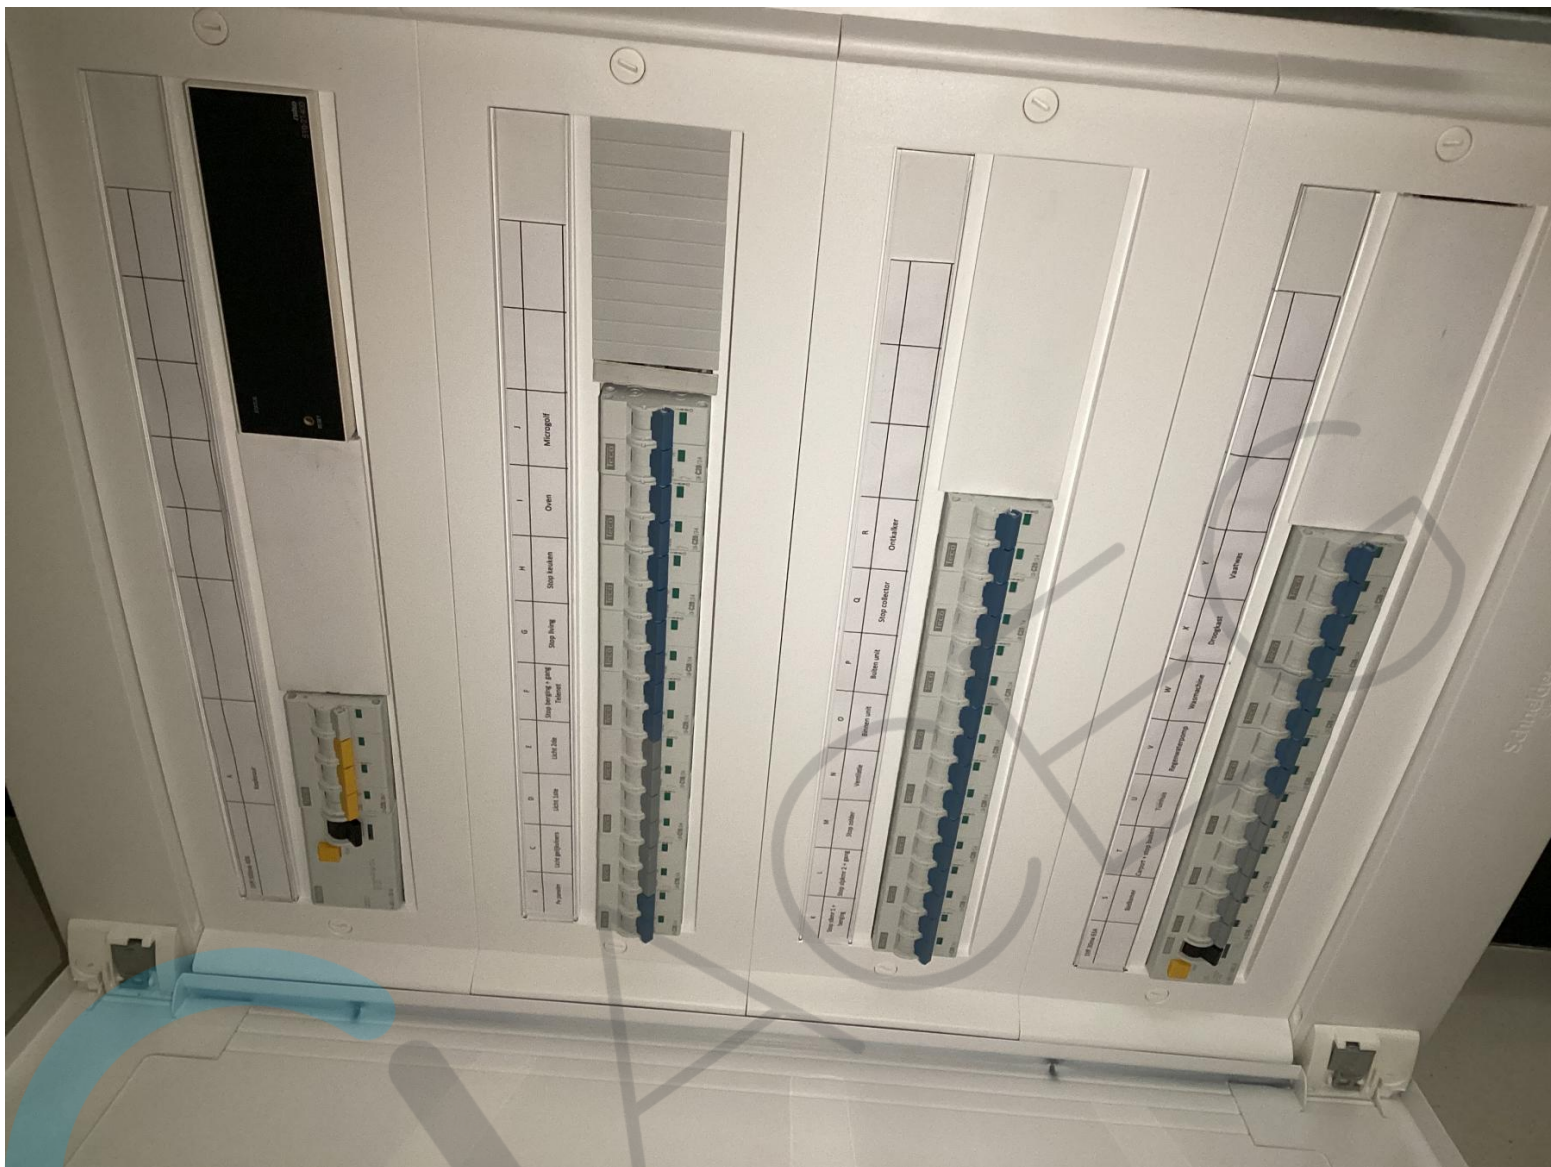







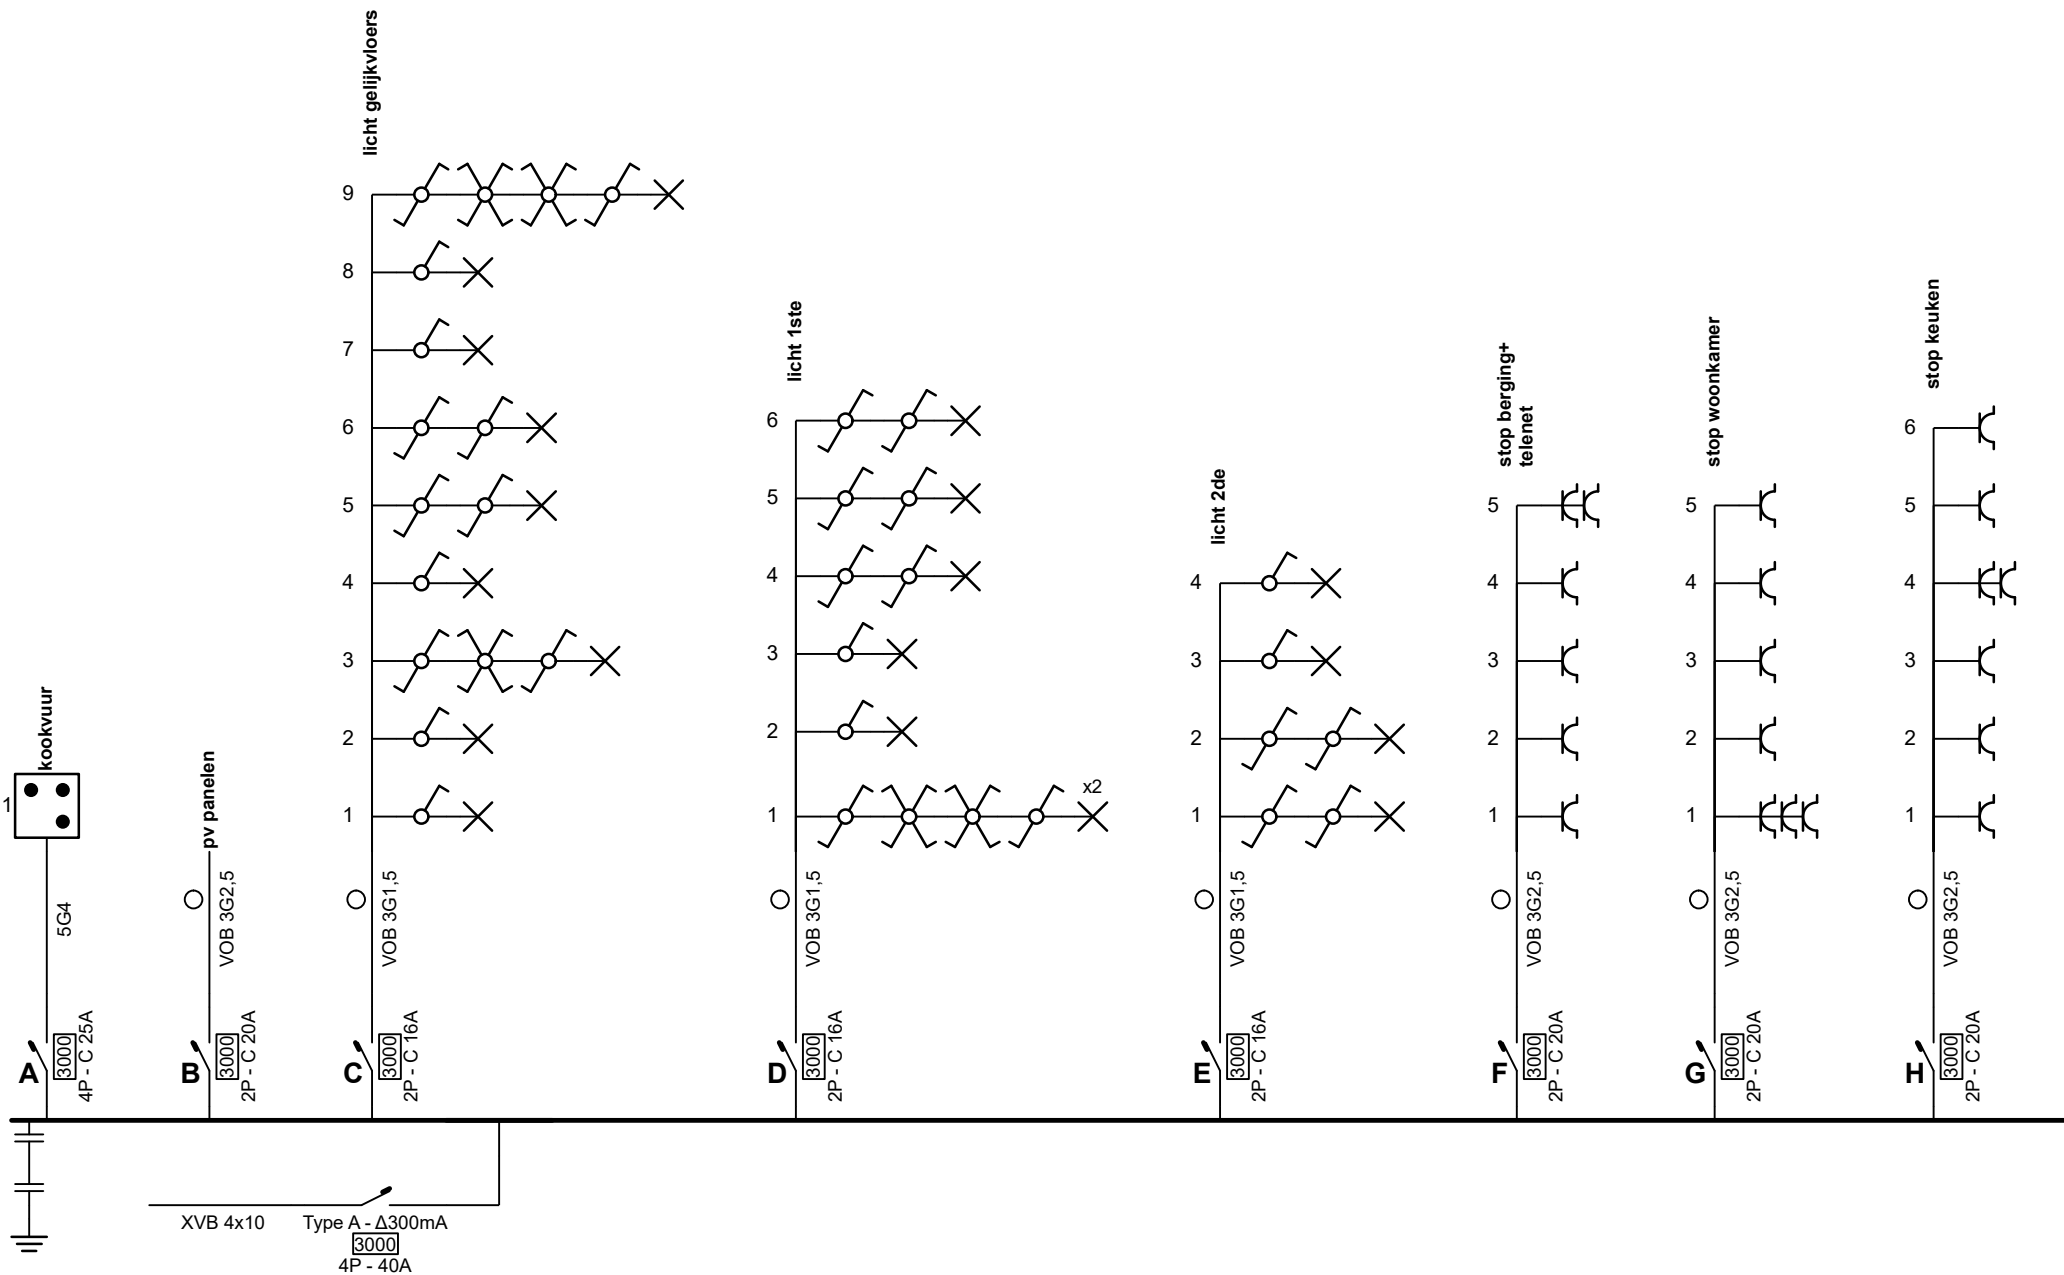

25/02/2024

XVB 4x10 Type A - Δ300mA  
 3000  
 4P - 40A

**ACEG**  
 Miguel Rodríguez Molina


52

**Plaats van de elektrische installatie**  
 Daelemans Jurgen/ Okens Christel  
 Hoogbos lot 7  
 92555 Buggenhout

**Installateur**  
 MP Electro bv  
 Veenbesstraat 10  
 2200 Herentals  
 GSM: 0499 99 16 77  
 e-mail: mpelectro2200@gmail.com  
 BTW BE 0738.961.836

  
**MP Electro**

p. 1/8  
**Eendraadschema**  
 3 x 400V + N ~ 50Hz  
 V.2024-02-25 10:41:24

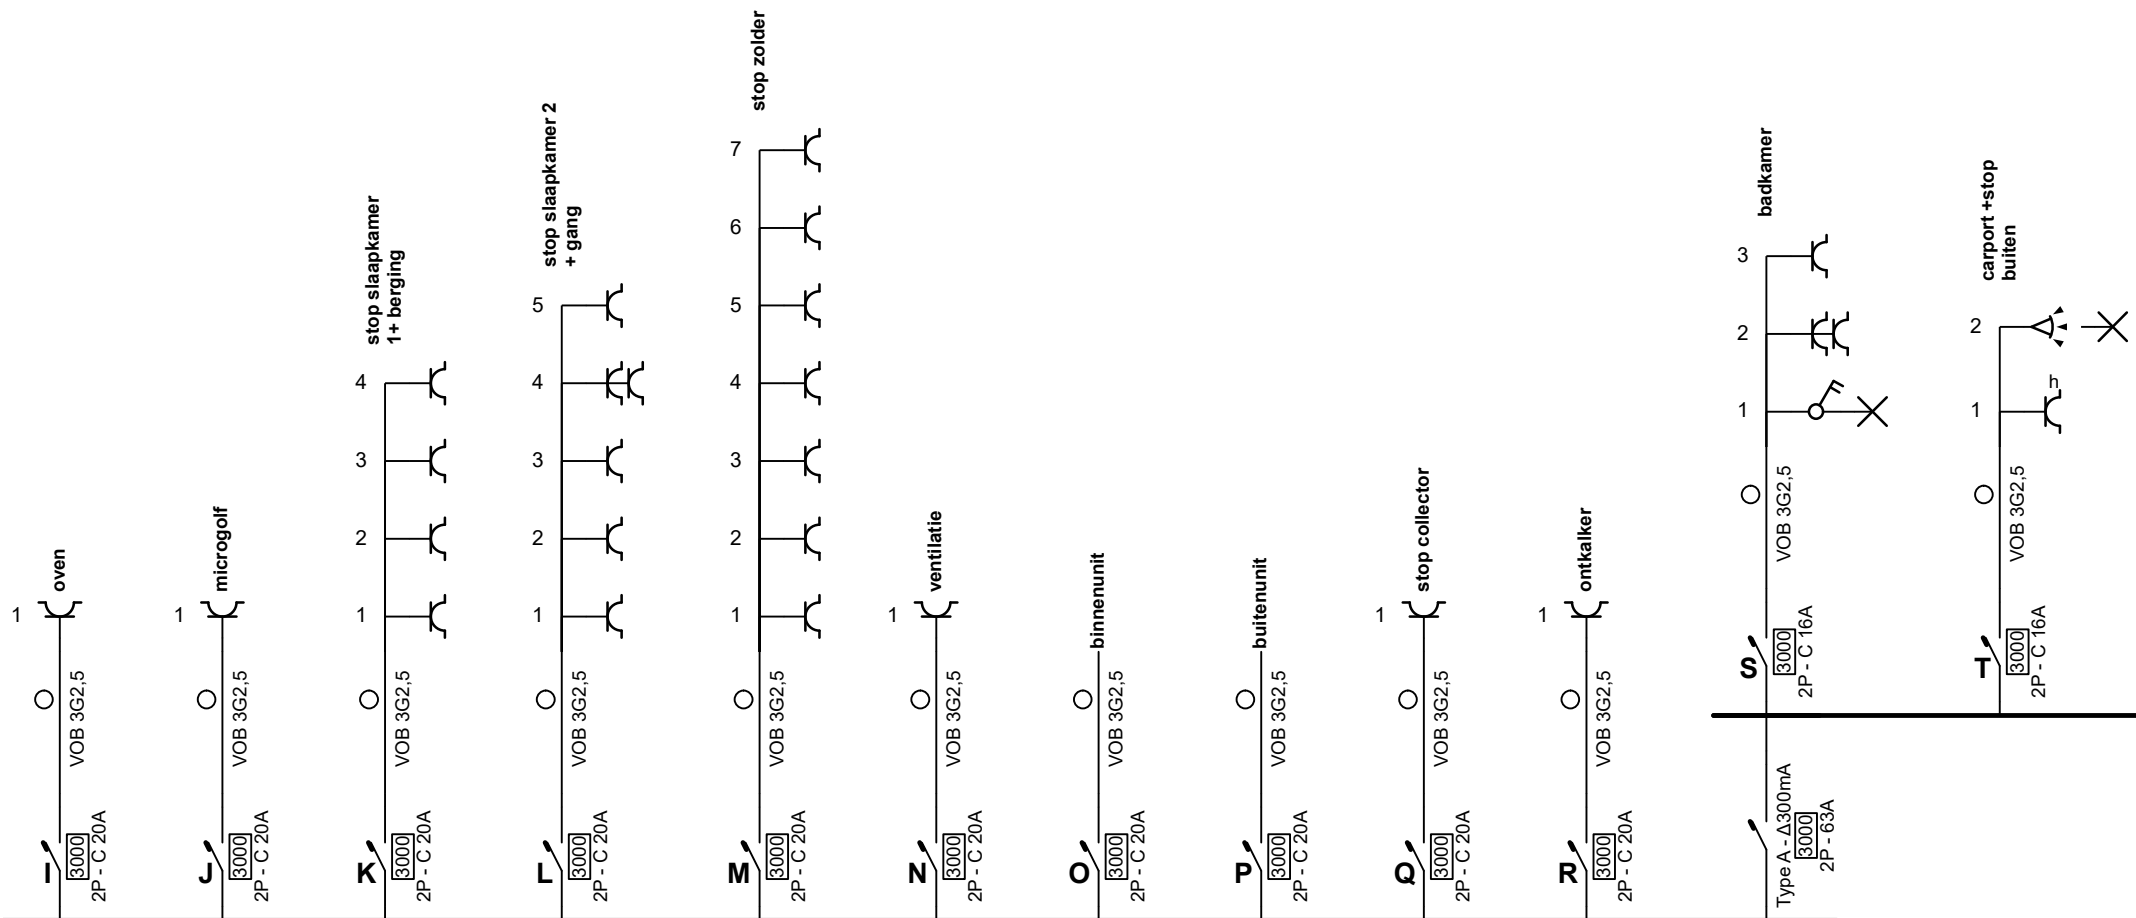

25/02/2024

**ACEG** 52  
Miguel Rodríguez Molina

**Plaats van de elektrische installatie**

Daelemans Jurgen/ Okens Christel  
Hoogbos lot 7  
92555 Buggenhout

**Installateur**


MP Electro bv  
Veenbesstraat 10  
2200 Herentals  
GSM: 0499 99 16 77  
e-mail: mpelectro2200@gmail.com  
BTW BE 0738.961.836

  
MP Electro

p. 2/8  
**Eendraadschema**

3 x 400V + N ~ 50Hz

V.2024-02-25 10:41:24

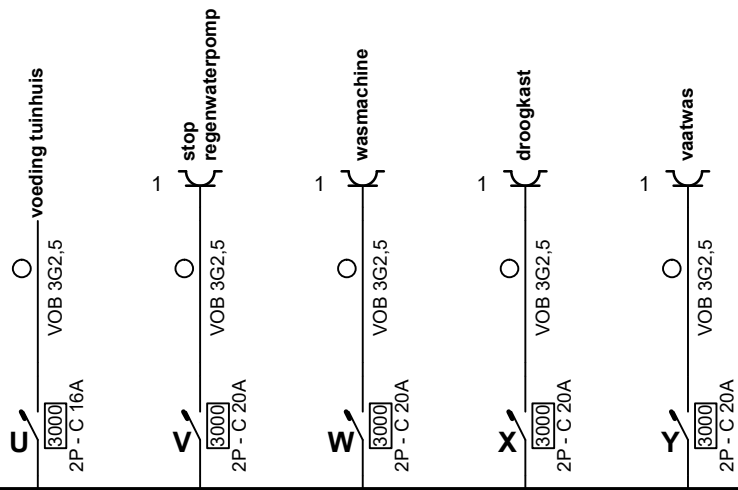

25/02/2024

  
 Miguel Rodríguez Molina

**Plaats van de elektrische installatie**

Daelemans Jurgen/ Okens Christel  
 Hoogbos lot 7  
 9255 Buggenhout

**Installateur**

MP Electro bv  
 Veenbesstraat 10  
 2200 Herentals  
 GSM: 0499 99 16 77  
 e-mail: mpelectro2200@gmail.com  
 BTW BE 0738.961.836

  
 **MP Electro**


p. 3/8  
**Eendraadschema**

3 x 400V + N ~ 50Hz

V.2024-02-25 10:41:24

T2 X T2

Gelijkvloers

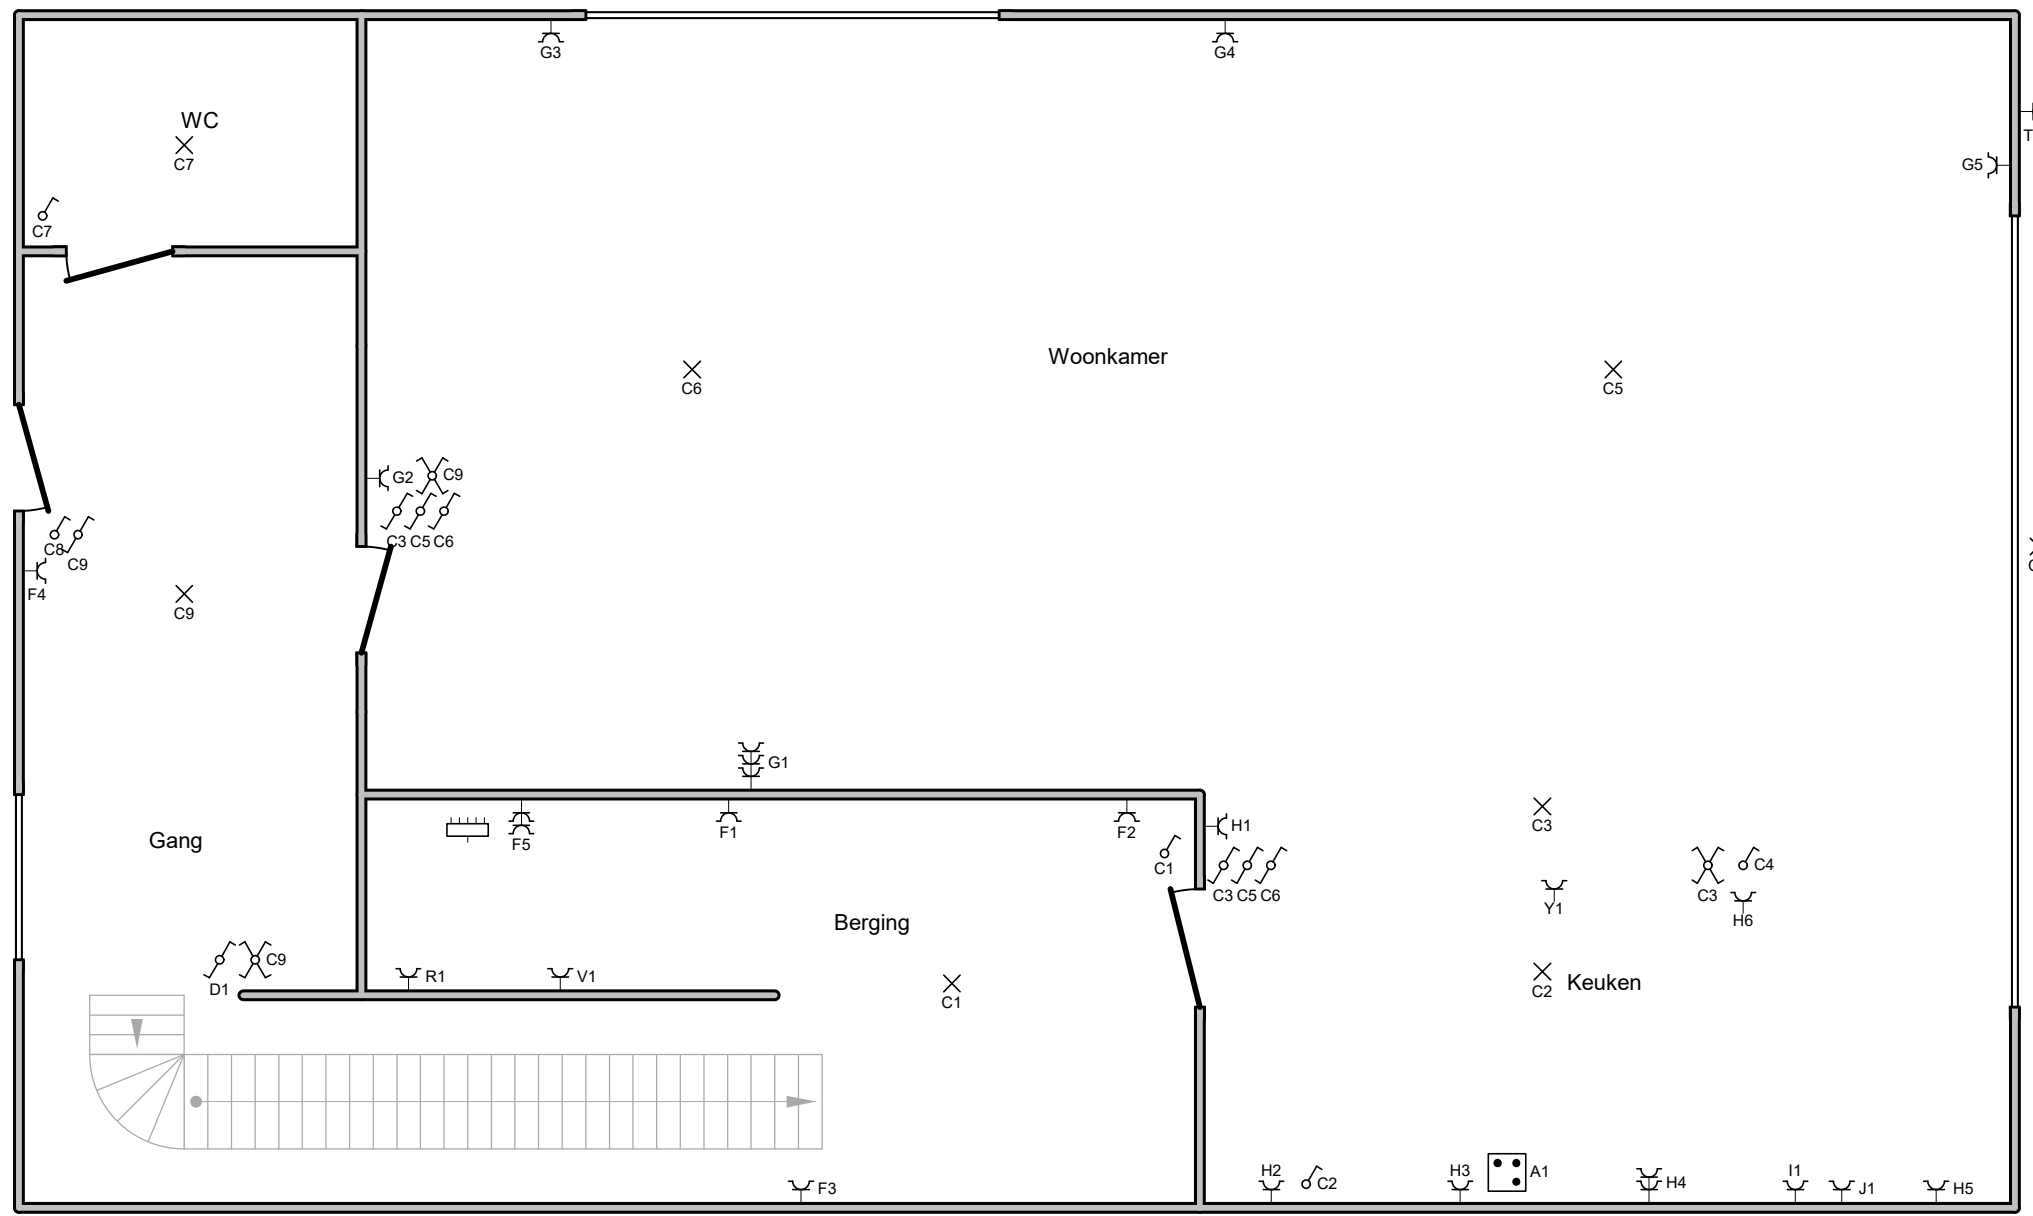

25/02/2024



**Plaats van de elektrische installatie**  
 Daelemans Jurgen/ Okens Christel  
 Hoogbos lot 7  
 9255 Buggenhout


**Installateur**  
 MP Electro bv  
 Veenbesstraat 10  
 2200 Herentals  
 GSM: 0499 99 16 77  
 e-mail: mpelectro2200@gmail.com  
 BTW BE 0738.961.836



**p. 4/8**  
**Situatieschema**

3 x 400V + N ~ 50Hz

V.2024-02-25 10:41:24

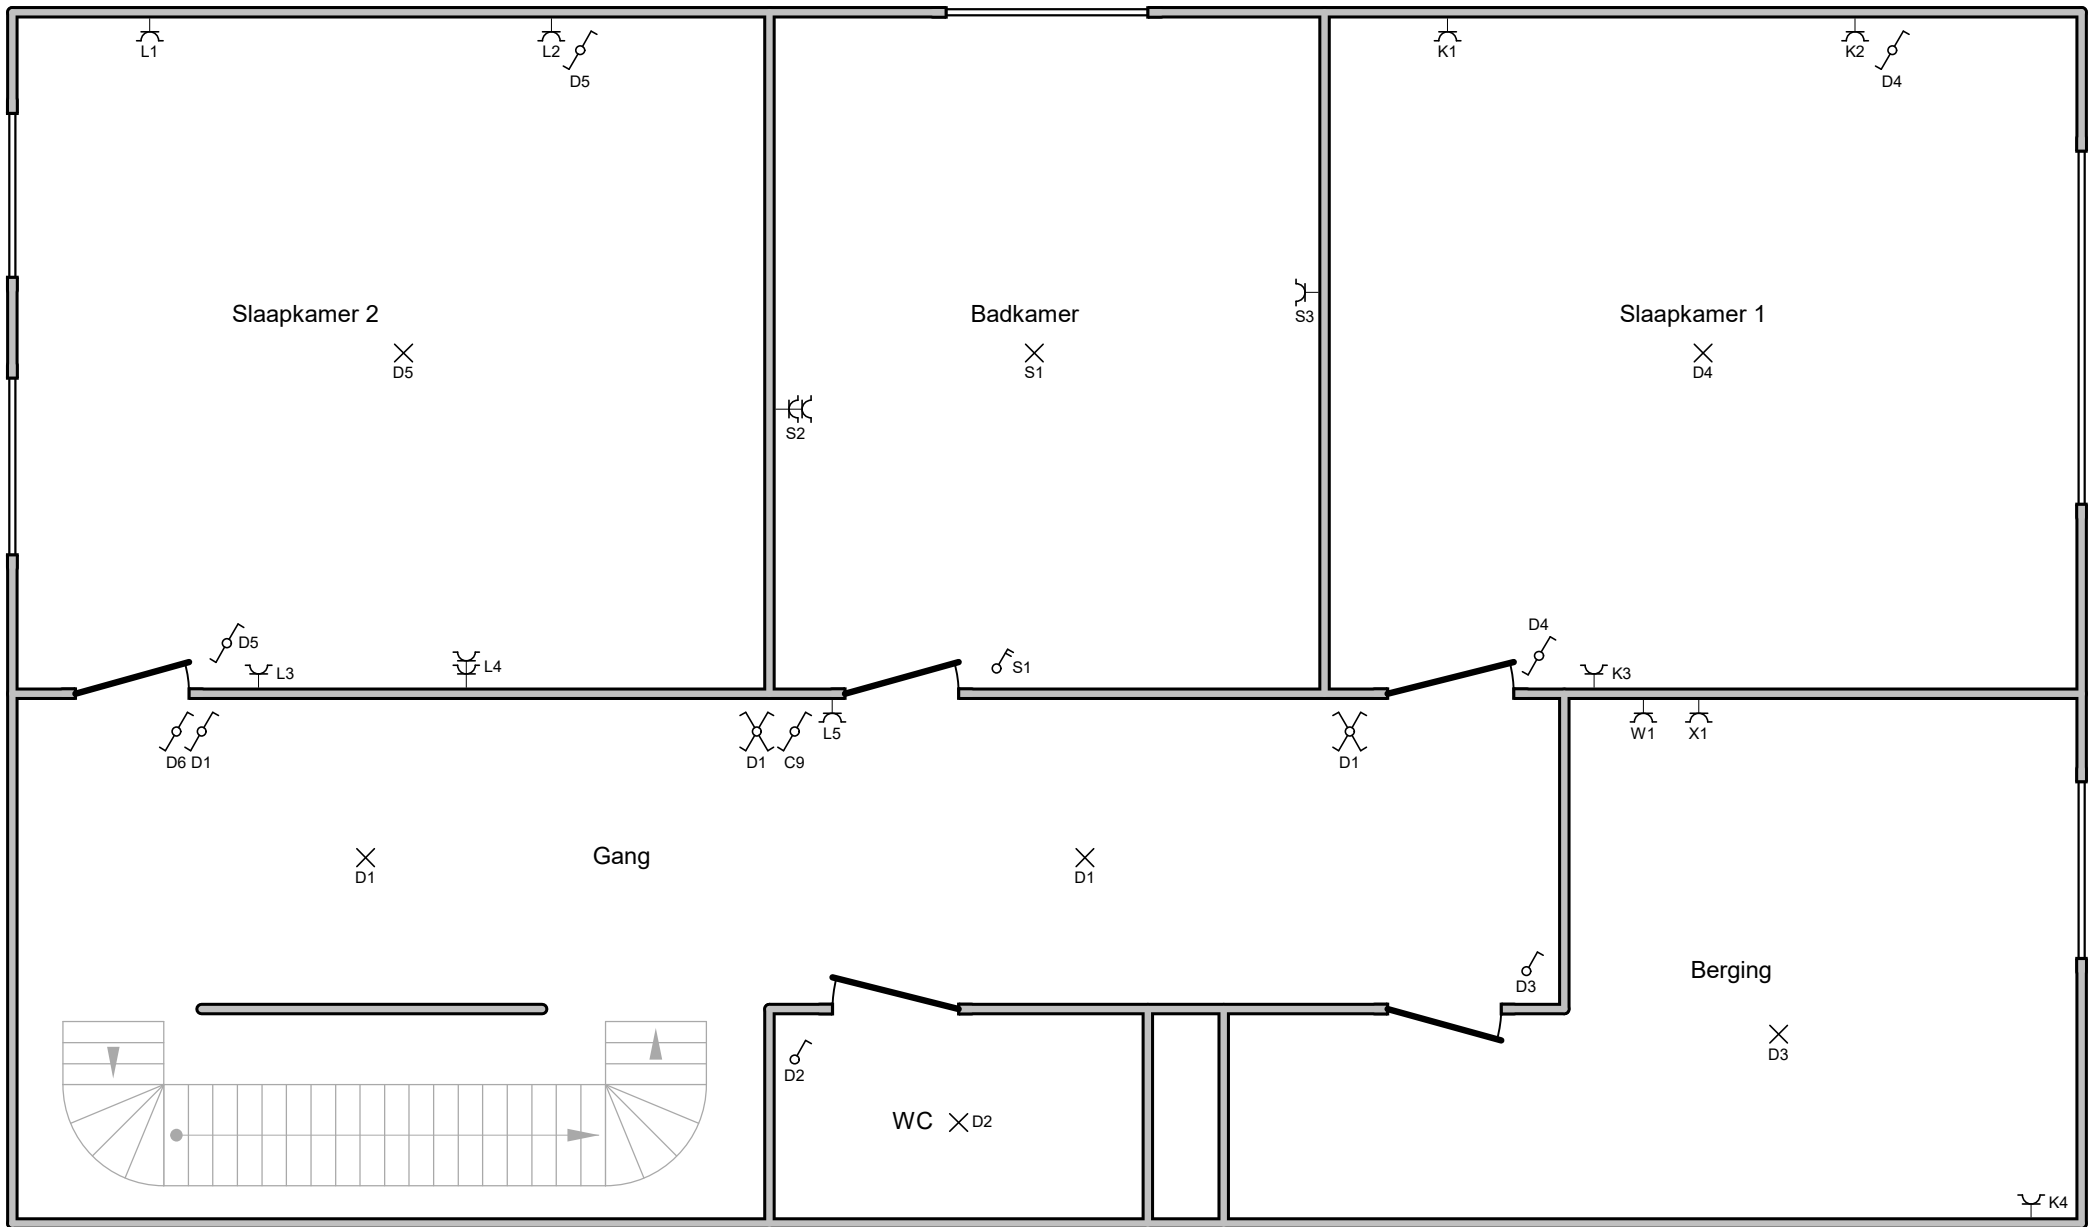

25/02/2024

**Plaats van de elektrische installatie**  
 Daelemans Jurgen/ Okens Christel  
 Hoogbos lot 7  
 9255 Buggenhout


**Installateur**  
 MP Electro bv  
 Veenbesstraat 10  
 2200 Herentals  
 GSM: 0499 99 16 77  
 e-mail: mpelectro2200@gmail.com  
 BTW BE 0738.961.836

**p. 5/8**  
**Situatieschema**

3 x 400V + N ~ 50Hz

V.2024-02-25 10:41:24



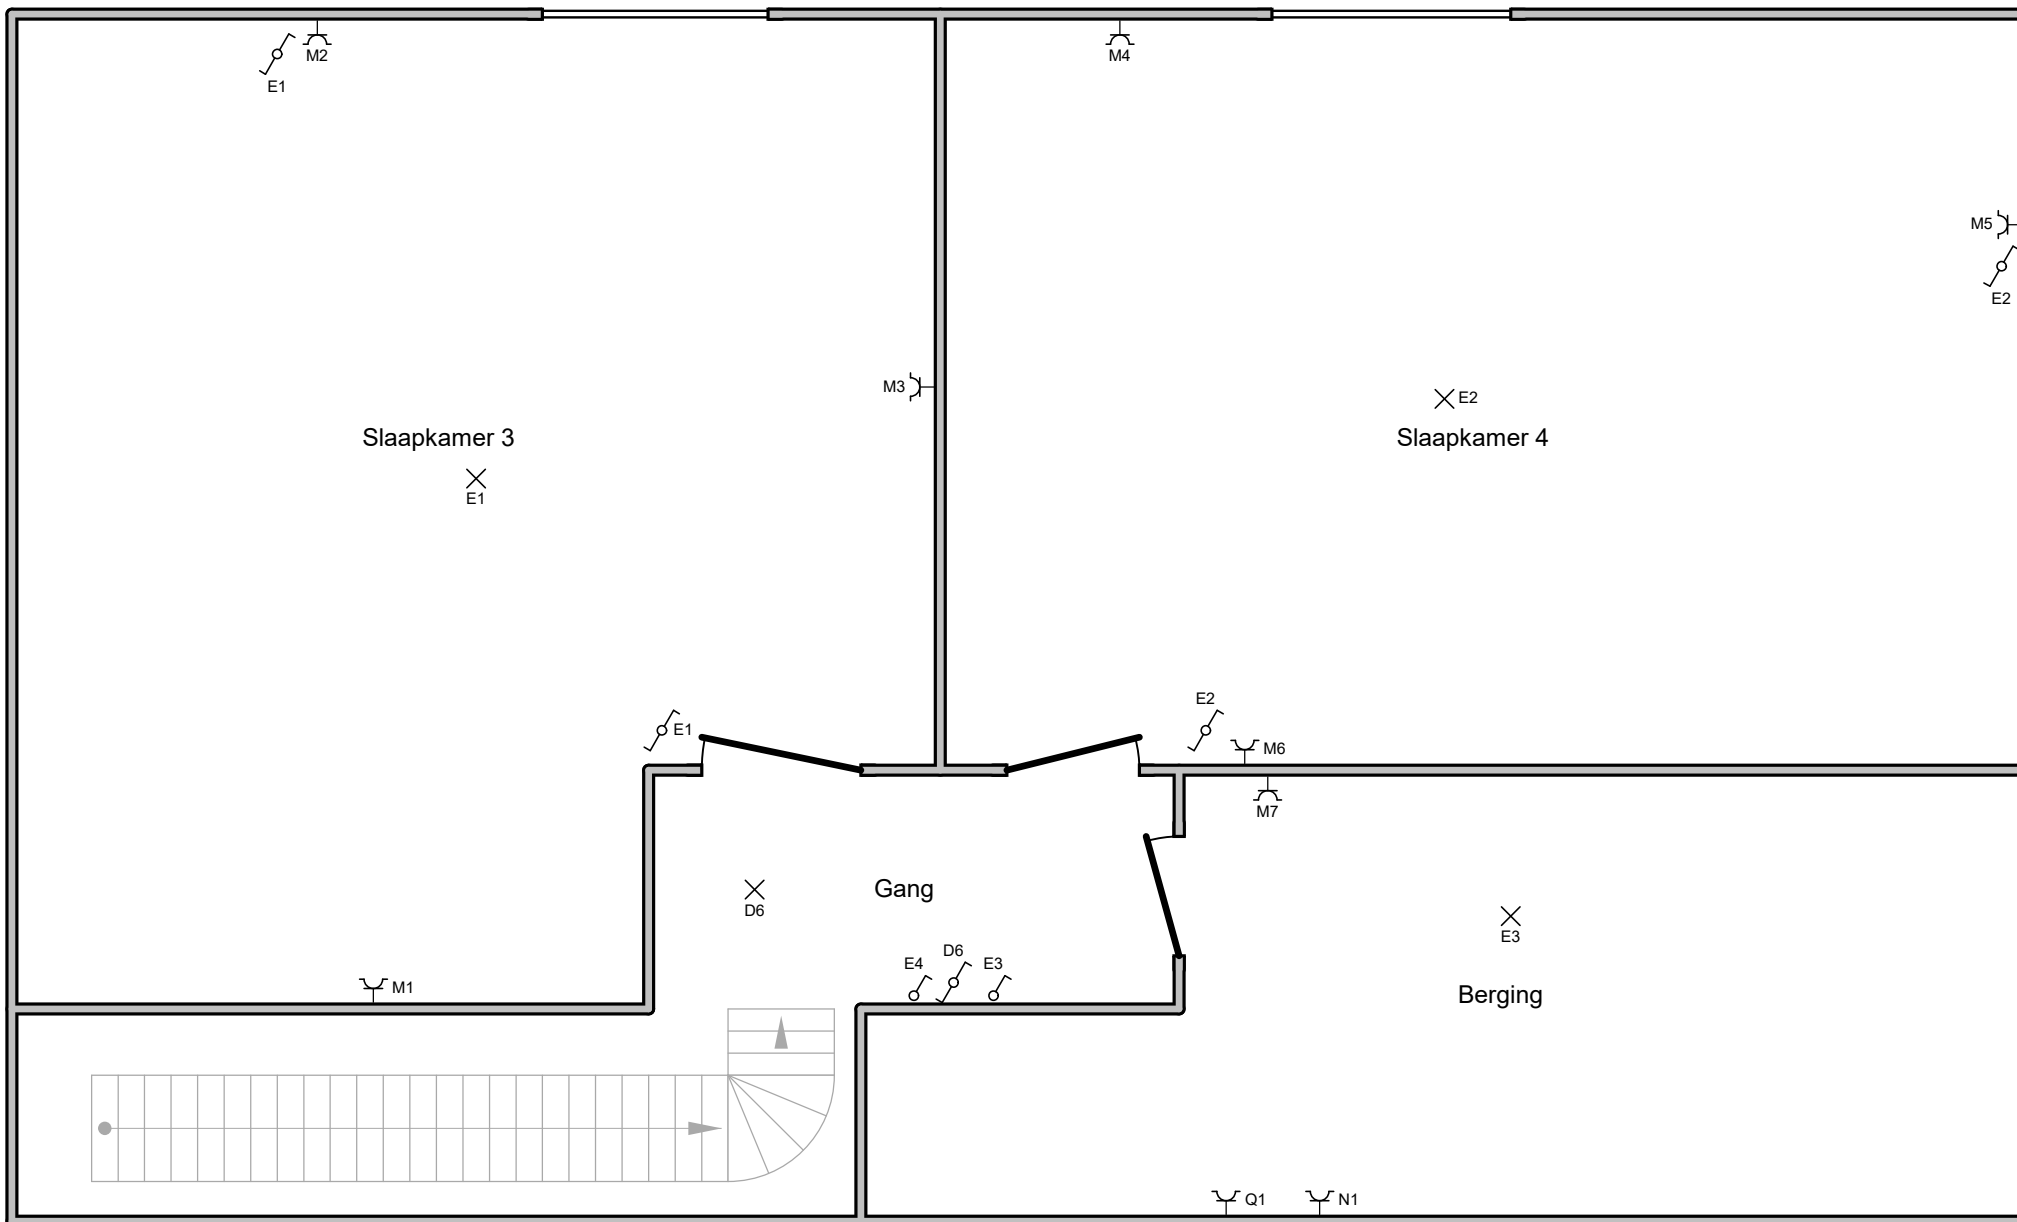

25/02/2024

**GACEG** 52  
 Miguel Rodríguez Molina

**Plaats van de elektrische installatie**  
 Daelemans Jurgen/ Okens Christel  
 Hoogbos lot 7  
 9255 Buggenhout

**Installateur**  
 MP Electro bv  
 Veenbesstraat 10  
 2200 Herentals  
 GSM: 0499 99 16 77  
 e-mail: mpelectro2200@gmail.com  
 BTW BE 0738.961.836


  
 MP Electro

p. 6/8  
**Situatieschema**

3 x 400V + N ~ 50Hz

V.2024-02-25 10:41:24

×  
E4



25/02/2024

  
GACEG  
Miguel Rodríguez Molina

52

**Plaats van de elektrische installatie**

Daelemans Jurgen/ Okens Christel  
Hoogbos lot 7  
9255 Buggenhout

**Installateur**

MP Electro bv  
Veenbesstraat 10  
2200 Herentals  
GSM: 0499 99 16 77  
e-mail: mpelectro2200@gmail.com  
BTW BE 0738.961.836

  
  
MP Electro

p. 7/8  
**Situatieschema**

3 x 400V + N ~ 50Hz

V.2024-02-25 10:41:24

- A** kookvuur
- B** pv panelen
- C** licht gelijkvloers
- D** licht 1ste
- E** licht 2de
- F** stop berging+ telenet
- G** stop woonkamer
- H** stop keuken
- I** oven
- J** microgolf
- K** stop slaapkamer 1+ berging
- L** stop slaapkamer 2 + gang
- M** stop zolder
- N** ventilatie
- O** binnenunit
- P** buitenunit
- Q** stop collector
- R** ontkalker
- S** badkamer
- T** carport +stop buiten
- U** voeding tuinhuis
- V** stop regenwaterpomp

- W** wasmachine
- X** droogkast
- Y** vaatwas

25/02/2024



**Plaats van de elektrische installatie**

Daelemans Jurgen/ Okens Christel  
 Hoogbos lot 7  
 9255 Buggenhout

**Installateur**

MP Electro bv  
 Veenbesstraat 10  
 2200 Herentals  
 GSM: 0499 99 16 77  
 e-mail: mpelectro2200@gmail.com  
 BTW BE 0738.961.836



p. 8/8  
**Lijst Kringen**

3 x 400V + N ~ 50Hz

V.2024-02-25 10:41:24
