

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

|                           |                   |              |                    |                  |  |               |   |
|---------------------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------|--|---------------|---|
| Datum keuring:            | 12/08/2026        | Inspecteur:  | Jetske Augustijnen | Mentor:          |  | Installateur: | - |
| ID-label:                 |                   | B.T.W. nr.:- |                    | Klantreferentie: |  |               |   |
| Merk en type meettoestel: | Metrel MI 3102 BT | Serienummer: | 23021936           |                  |  |               |   |

Datum verslag: 26/08/2026

Plaats van het onderzoek

|            |                |
|------------|----------------|
| Straatnaam | Peisegemstraat |
| Huisnummer | 38             |
| Busnummer  |                |
| Postcode   | 1785           |
| Gemeente   | MERCHTEM       |
| Land       | België         |

Eigenaar

|            |                |
|------------|----------------|
| Naam       | -              |
| Straatnaam | Peisegemstraat |
| Huisnummer | 38             |
| Busnummer  |                |
| Postcode   | 1785           |
| Gemeente   | MERCHTEM       |
| Land       | België         |

Installateur

|                |   |
|----------------|---|
| Naam           | - |
| BTW nr.        | - |
| Telefoonnummer | - |
| E-mail         | - |

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820061073577

Teller Nr.: : 1SAG1200325645



Aard onderzoek:

|                       |                    |                                 |                       |
|-----------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Netbeheerder: FLUVIUS | Spanning: 1~230V   | Meter / bord verbinding: 10 mm² | Max beveiliging: 40 A |
| Aantal borden: 1      | Aantal kringen: 10 |                                 |                       |
| Aardelektrode:        |                    |                                 |                       |
| Ri algemeen: - MΩ     | RE: - Ω            |                                 |                       |

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

| Δ (mA) | In (A) | In - andere (A) | It | Type | Beveiligde kringen | Test | x 2,5 |
|--------|--------|-----------------|----|------|--------------------|------|-------|
| 300    | 40     |                 | -  | A    | 10                 | OK   | NOK   |

BESCHRIJVING INSTALLATIE

| Aantal kringen | Curve | Bescherming IN (A) | (andere) | P | Sectie (mm²) |
|----------------|-------|--------------------|----------|---|--------------|
| 2              | C     | 20                 |          | 2 | 4            |
| 4              | C     | 20                 |          | 2 | 2,5          |
| 1              | C     | 40                 |          | 2 | 6            |
| 3              | C     | 16                 |          | 2 | 2,5          |

Visueel nazicht (algemeen) NOK Directe aanraking NOK Indirecte aanraking NOK

Aansluitingen NOK schema in bijlage door Aceg vzw NA

|                             |                     |                          |     |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----|
| Equipotentiale verbindingen | niet van toepassing | Doorsnede geleiders      | OK  |
| Continuïteit                | NOK                 | Verlichting / toestellen | NVT |

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- I1.01 Eéndraadschema van de installatie is niet aanwezig. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)
- I1.03 Situatieschema van de installatie is niet aanwezig. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)
- I2.03 De continuïteit van equipotentiaalverbindingen en/of beschermingsgeleiders zijn niet gewaarborgd. (Boek 1 Onderafdeling 5.3.5.3.G. en 5.4.3.5)
- I3.01 Aardelektrode ontbreekt. Aardingsweerstand niet gemeten. (Boek 1 Onderafdeling 4.2.3.1 en 5.4.2.1.)
- I4.01 Hoofdequipotentiale verbinding(en) niet verwezenlijkt. (Boek 1 Onderafdeling 5.4.4.1. en 5.1.6.2)
- I5.01 De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz dient aangebracht of vervolledigd te worden. (Boek 1 Onderafdeling 3.1.3.1. en 3.1.3.3.A. en 5.1.6.1)
- I5.02 Elke elementaire stroombaan moet met een hoofdletter aangeduid worden. Elk lichtpunt, contactdoos, moeten genummerd worden in volgorde gezien vanaf de beschermingsinrichting tegen overstroom. (Boek 1 onderafdeling 3.1.2.1.)
- I6.04 Een differentieelstroombeschermingsinrichting met een gevoeligheid van 30mA is te plaatsen voor installaties van badkamer, wasmachine, vaatwas, droogkast en/of gelijkaardige toestellen. Deze dient ondergeschikt te zijn aan de hoofddifferentieelstroombeschermingsinrichting (Boek 1 Onderafdeling 7.1.4.3. en 4.2.4.3.)
- I8.15 Het gebruik van verdeelstekkers is enkel toegelaten bij aansluiting van snoeren op de vaste installatie, vaste aansluiting is dus verboden. (Boek 1 Onderafdeling 5.2.6.2.)
- I8.17 De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden te isoleren. (Boek 1 Onderafdeling 4.2.3.3.b)
- I9.07 Niet alle contactdozen op LS zijn kinderveilig conform NBN C 61-112-1:2017. (Boek 1 Onderafdeling 1.4.2.3. en 5.3.5.2.)
- I9.13 Elektrisch materieel zonder bodem mag niet rechtstreeks op brandbaar materiaal geplaatst worden. (Boek 1 Onderafdeling 5.1.1.2.)
- N17 De aardspreidingsweerstand kon niet gemeten worden. Deze dient bij voorkeur kleiner te zijn dan 30ohm.
- N18 De isolatieweerstand kon niet gemeten worden. Deze dient groter te zijn dan 0,5Mohm.
- N3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.

BESLUIT

- ☒
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.** Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór 12/8/2027. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Voor huishoudelijke installaties wordt bovendien:

  - het nazicht op de verdwijning van de inbreuken verricht door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd
  - de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd, ingelicht van het bestaan van inbreuken ingeval geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

Inspectietijd: van 11:17 tot 12:27

De inspecteur Jetske Augustijnen



Jetske Augustijnen  
ACEG VZW - #255


De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

| Stappenplan voor een installatie die niet conform is:                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stap 1                                                                                                                                   | Stap 2                                                                                                                   | Stap 3                                                                                                   |
| Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg ervoor dat alle inbreuken worden opgelost en besteed voldoende aandacht aan de eventuele nota's. | Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak. | ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is. |



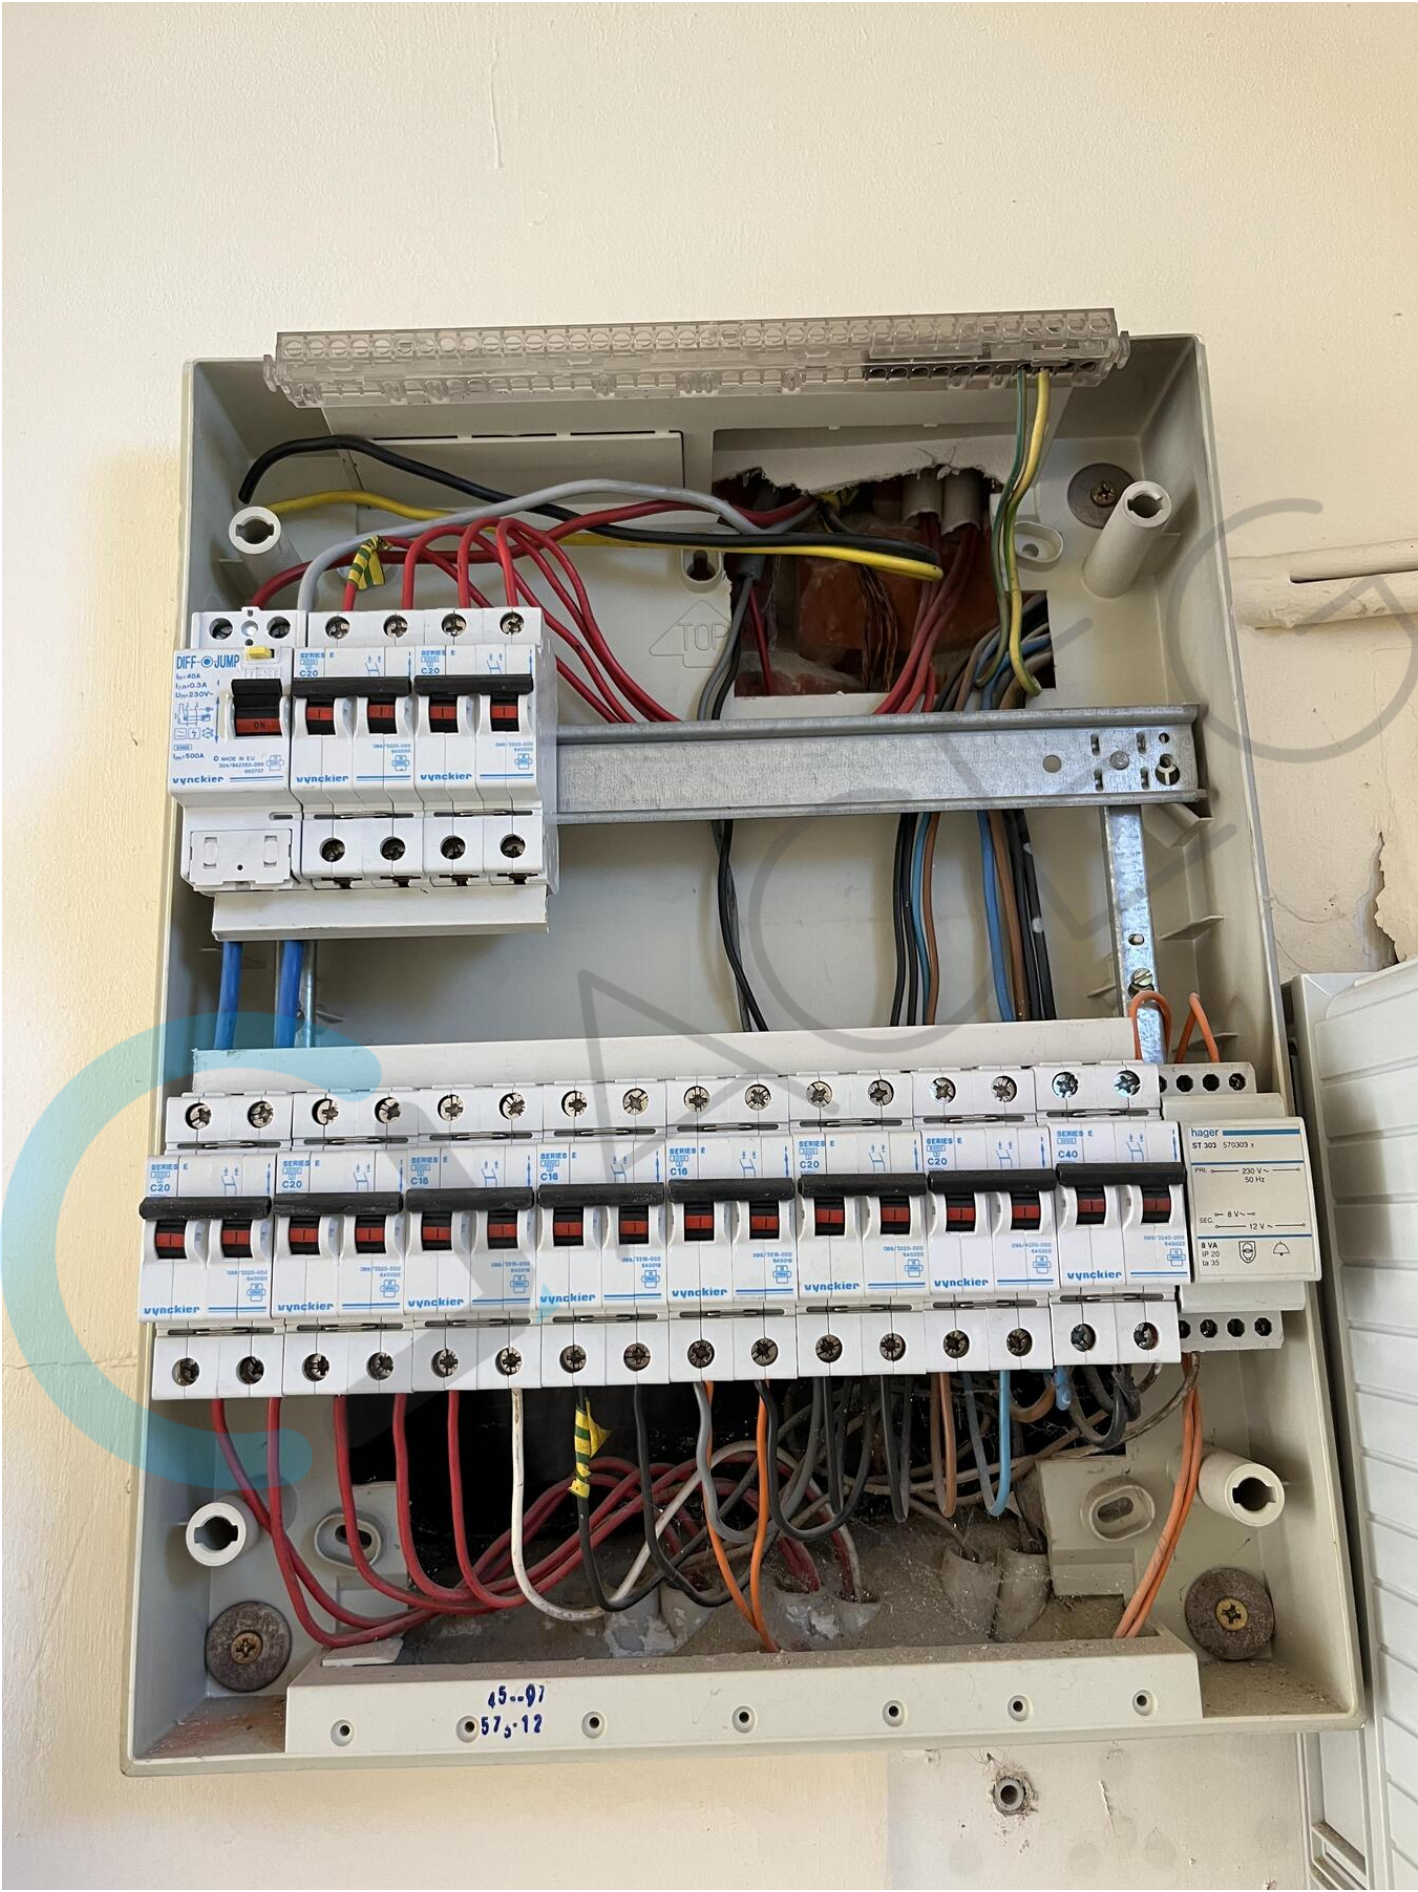

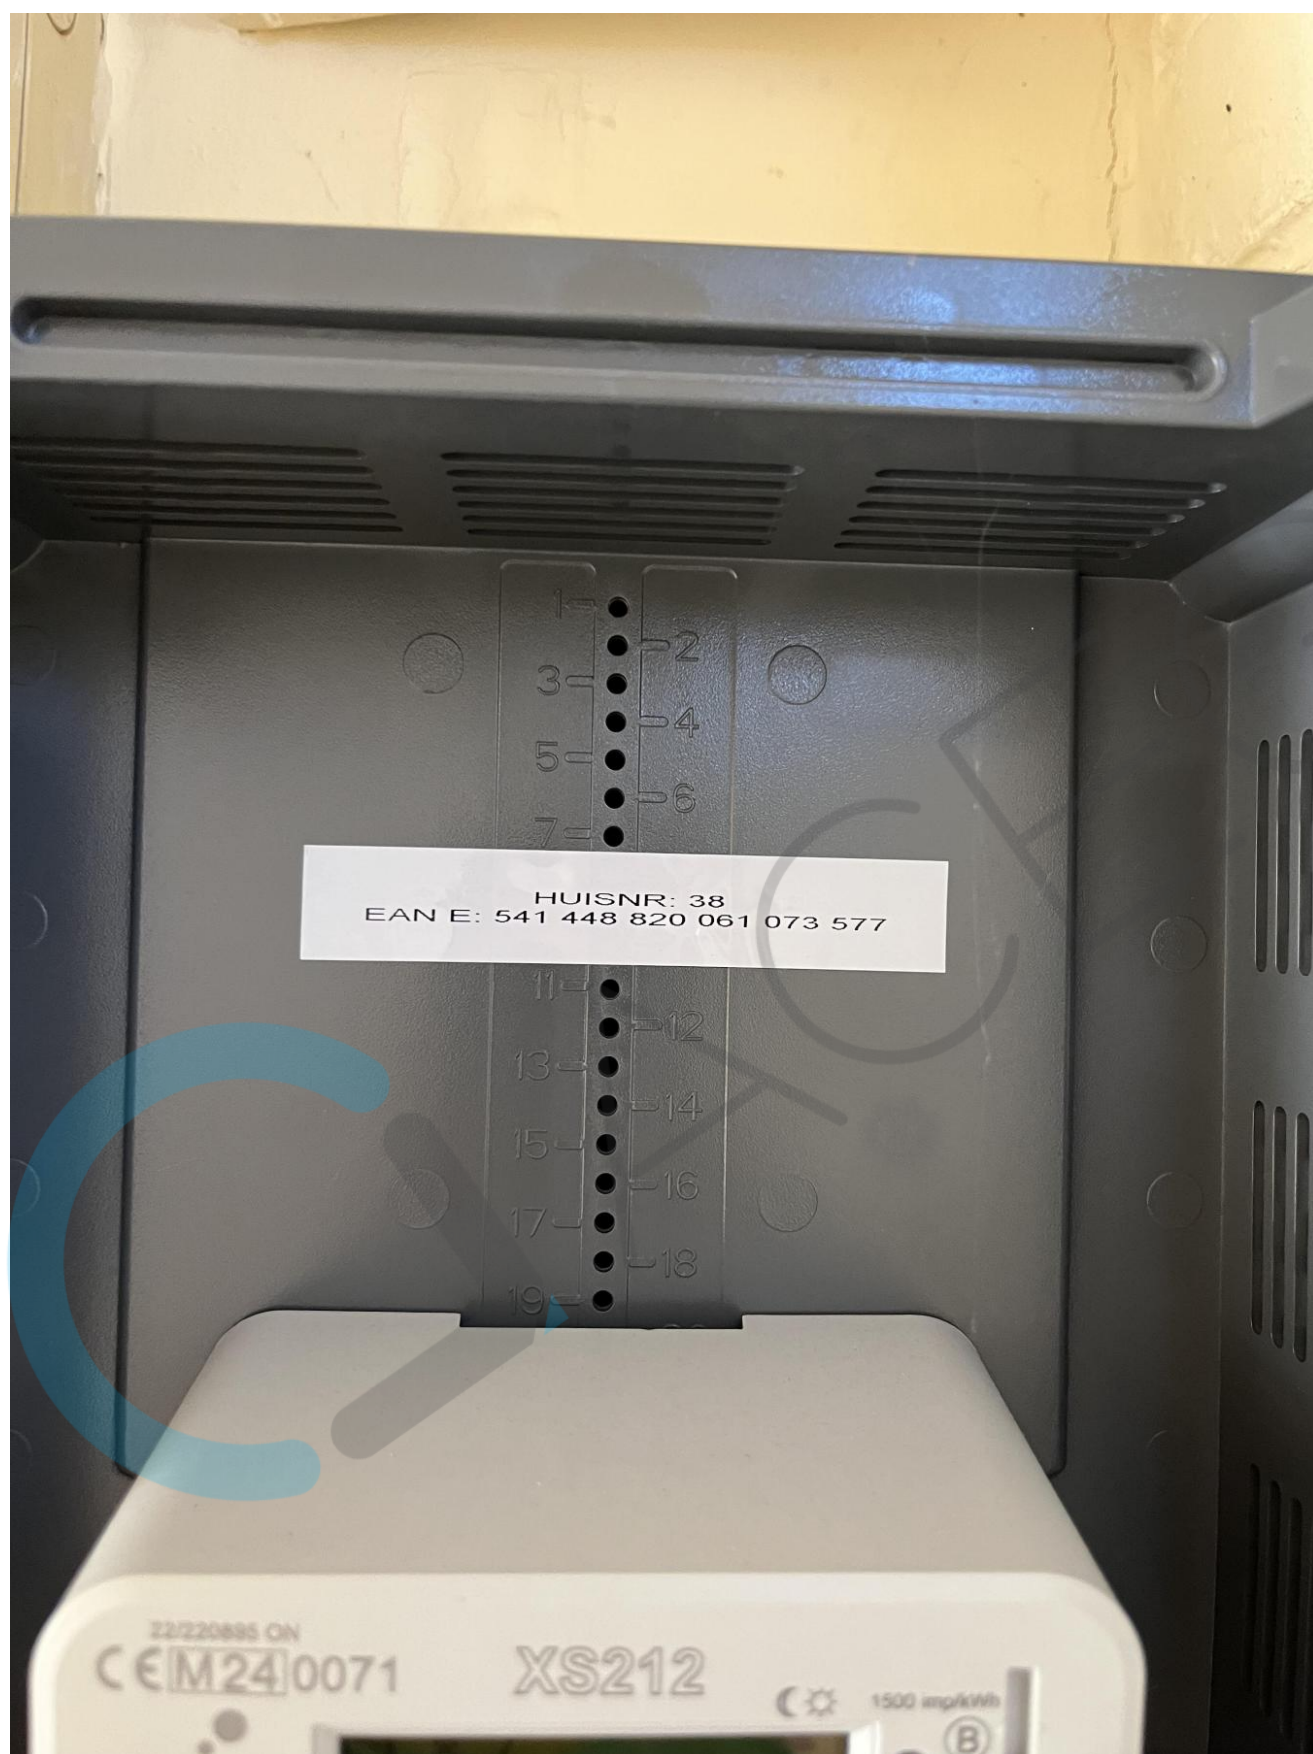

Z2/Z20895 ON  
CE M24 0071

XS212



1500 imp/kWh









