

Verslag van onderzoek: controle van een zonnepaneelinstallatie
Rapport de visite: contrôle d'une installation de panneaux solaires

Verslagnummer: N° de rapport:	287/2022/11/8/9	Datum van bezoek / Date de visite:	8/11/2022
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Van Hamme Technics Hanenstraat 147A - 9255 BUGGENHOUT BE 0740.514.430		
Controle volgens Boek 1 - Elektrische installatie op LS en ZLS: Contrôle selon Livre 1 - Installations électriques à BT et à TBT:	Gelijkvormigheidsonderzoek voor de ingebruikname belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4) / Contrôle de conformité avant mise en usage modification/extension importante(6.4) Beveilig. tegen de onrechtstreekse aanrakingen / Protect. contre les contacts indirects: Huishoudelijk (4.2.4.3) / Domestique (4.2.4.3) Specifieke en/of regionale reglementen / Réglementation spécifiques ou locales: C10/11		
Betreft: Concerne:	Uitbreiding van de elektrische installatie met een PV-systeem		
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Krapstraat 149 bus 102 - 9255 BUGGENHOUT		
Eigenaar / Propriétaire:	ENG. VC		
Installateur:	Van Hamme Technics	BTW/TVA:	BE 0740.514.430
Aanwezigen: Personnes présentes:	Zaakvoerder Van Hamme Technics		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS-PV (ELS4) (Controle van een zonnepaneelinstallatie)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:	OK	NOK	NVT
Elektrisch dossier: Dossier électrique:	✓		

Modules:

CE-attest / CE-attestation:		OK		Klasse / classe:		II								
Aantal / Nombre:		3 st./p.		Type:	Eurener MEPV 340-B	Wp / module:	340	Totaal vermogen / Puissance totale:		1020	Wp			
U _N per module: U _N par module:	41.61	V	U _N totaal: U _N total:	41.61	V	I _N per module: I _N par module:	9.98	A	I _N totaal: I _N total:	3 x 9,98	A	I _{SC} module:	10.57	A

Omvormer(s) / onduleur(s):

Merk en model: Marque et modèle:	AP Systems - QS1	P _{ac} max:	1.26 kVA	U _N (DC):	60 V	I _N (DC):	4 x 12 A	Serienummer omvormer: N° de série onduleur:	806000026374
-------------------------------------	------------------	----------------------	----------	----------------------	------	----------------------	----------	--	--------------



Aansluiting in verdeelbord / connection au tableau distribution:												
Beveiliging: Protection:	Aut. 2P	I _N :	16	A	I _{cc} :	3000	A	Curve: Courbe:	C	U _N :	400	V
Klasse groene teller: Classe compteur vert:		Serienummer groene teller: N° de série compteur vert:	-						Stand groene stroom teller: Index du compteur vert:	- kWh		
ID/DSI: DA/DD:	Diff. 2P/63A/300mA	Voedingspunt: Point d'alimentation:	1N400V - XVB 3G2,5									

Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:		OK	NOK POK	NVT PA
Visuele controles/contrôles visuels:		✓		
PE continuïteit en equipotentialiteit/continuité PE et liaisons équipotentielle:		✓		
1.4.1.1 + 1.4.1.2 + 5.1.1	Attest van het systeem is aanvaardbaar (modules + omvormer) / L'attestation du système est acceptable (modules + convertisseur)	✓		
1.4.1.3	U _{omvormer} > U _{modules totaal} / U _{convertisseur} > U _{modules totaux}	✓		
	I _{omvormer} > I _{modules totaal} / I _{convertisseur} > I _{modules totaux}	✓		
	Aansluitingen? / Raccordements?	✓		
4.2.2.1	Directe aanraking? / Contact direct?	✓		
4.4.1	Voldoet de overstrombeveiliging? / La protection contre la surintensité est elle efficace?	✓		
7.1.1.2	Indien klasse I – geaard? / Si classe I – mise à la terre?			✓
5.3.3.1 + 7.1.1.2.3	Veilige ontkoppeling is mogelijk? / Sectionnement sûr est-il possible?	✓		
3.1.2.1	Schema's aanwezig? / Schémas présents?	✓		
1.4.2 + 9.1.2	Fabrikanteninstructies gevolgd? / Instructions du fabricant, sont-elles suivies?	✓		
6.4.5.1 + 5.4.2.1	Meetresultaten in orde? / Résultats des mesures en ordre? Isol. U ≤ 250 V max.	✓		
5.2.7.2 + 5.2.7.3	Verbinding DC/AC omzetter? / Connexion onduleur DC/AC?	✓		
7.1.1.2	Pictogrammen / Pictogrammes?	✓		
Spreidingsweerstand van de aardverbinding / Résistance de dispersion de la prise de terre: R _A = 1.75 Ω		✓		
hulpelektroden / sondes de référence				
Isolatiweerstand / Résistance d'isolement: R _{iso} = 5.09 MΩ		✓		

Inbreuken / Infractions:

-Geen.

Opmerkingen / Remarques:

-Geen.

Nota's / Notes:

-Op het moment van de controle was het dak niet betreedbaar. Het aantal, de stringverdeling, het type panelen en de gegevens van de micro-omvormer werden overgenomen uit de gegevens die door de opdrachtgever werden verstrekt.
-Installatie aangesloten op teller met nr. 15AG1105112372
-EAN: 541 448 860 021 655 474

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. / Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Netbewakingsparameters niet kunnen verifiëren / Paramètres de surveillance du réseau ne peuvent pas vérifier

Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 8/11/2047

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden (opnieuw) gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie "werden (of waren)" verzegeld. /

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 8/11/2047

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation « étaient (ou) ont été » scellées.

Naam en handtekening van de inspecteur,
voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur,
pour le directeur,

PIETERS Andres

Algemene inlichtingen / renseignements généraux:

Herinnering aan de voorschriften van het Boek 1:

1. Het te onderhouden en de uitgevoerde tussenkomsten op de elektrische installatie te documenteren (onderhoud en test).
2. De nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 te allen tijde worden nageleefd.
3. De documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren (eendraadsschema's, situatieplannen, controleverslagen, ...), dat wordt samengesteld in tweevoud. Waarvoor een kopie ter beschikking van elke eventuele huurder wordt gesteld, die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van de eventuele huurder te stellen.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)


4. Het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken.
5. Onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties te stellen.
6. De verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden.
7. Een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.


Le rappel sur les prescriptions réglementaires du Livre 1:

1. D'en assurer l'entretien et de documenter toute intervention réalisée sur l'installation électrique (entretien et test).
2. De prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 soient en tout temps observées.
3. De conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire.
4. De transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant.
5. D'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.
6. De renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique.
7. De laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.

Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.

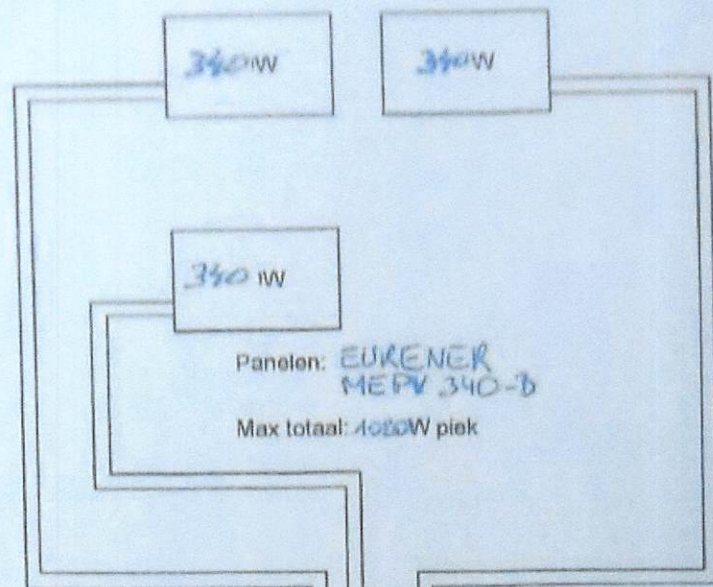

Panelen: EURENER
MEPV 340-B
Max totaal: 1020W piek



Micro-Inverter 1200W
AP SYSTEMS
Type: QS1200
SN: 806000026374
Pac: 1,26 kVA

2P/63A
30mA




3 x 2.5mm²

16
C2/20A

63
40A / 300mA

4 x 10 mm²



KWH-meter
G2/50Amp
240V-400V

ELECTROTEST
ANALOG METERS

andrew@electrotest.be
Gsm: +32 497 97 90 13


08.11.2022

ENG VC

Installatie adres
KRAPSTR 149/102 9255 BUGGENHOUT

1.3

Installateur
Van Hamme Technics Hanenstraat 147/A 9255 Buggenhout

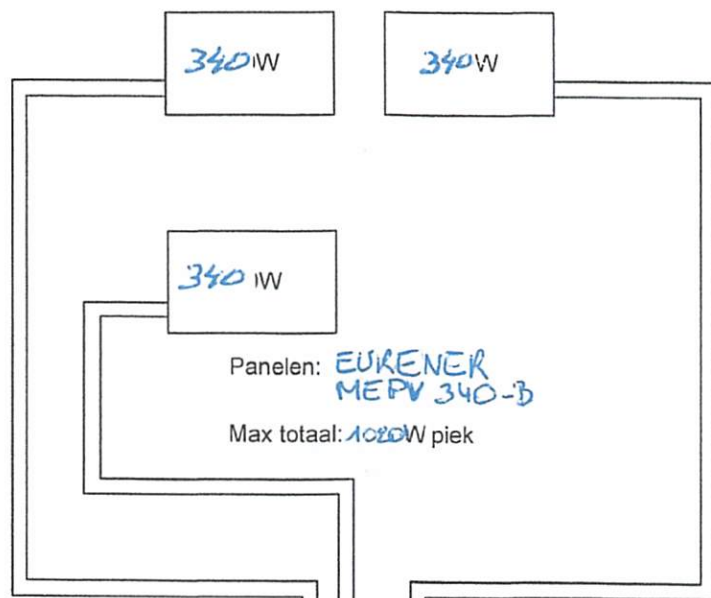

Panelen: EURENER
MEPV 340-B
Max totaal: 1020W piek



Micro-Inverter 1200W
AP SYSTEMS
Type: QS1200
SN: 806000026374

3 x 2.5mm²




C2/20A



40A / 300mA



4 x 10 mm²



KWH-meter
G2/50Amp
240V-400V

Installatie adres
KRAPSTR 149/102 9255 BUGGENHOUT

1.3

Installateur
Van Hamme Technics Hananstraat 147/A 9255 Buggenhout
